

◎局所的な放射能測定

除染前 測定日：平成23年12月27日、平成24年1年6日


除染後 測定日：平成24年3月30日、平成24年4年10日

単位：マイクロシーベルト/時

	場所	除染前			除染後		
		5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
1	地蔵前	0.50	0.26	0.22	0.24	0.24	0.24
2	おたまじゃくし池	0.72	0.35	0.28	0.08	0.08	0.09
3	雑木林	0.25	0.22	0.17	0.12	0.14	0.13
4	カブトムシ生息地	0.38	0.31	0.24	0.09	0.10	0.09
5	農園入口横水飲場	0.15	0.16	0.18	0.18	0.16	0.15
6	体育館 奥 雨どい①	0.49	0.29	0.26	0.11	0.09	0.08
7	体育館 奥 雨どい②	0.69	0.27	0.28	0.12	0.10	0.08
8	体育館 奥 雨どい③	0.74	0.28	0.23	0.14	0.11	0.09
9	体育館 奥 雨どい④	0.60	0.32	0.18	0.14	0.12	0.11
10	体育館 奥 雨どい⑤	0.71	0.23	0.24	0.11	0.09	0.08
11	体育館 奥 雨どい⑥	0.89	0.34	0.27	0.14	0.13	0.10
12	体育館 奥 雨どい⑦	0.50	0.38	0.28	0.13	0.11	0.10
13	体育館 渡り廊下雨どい①	0.60	0.33	0.28	0.14	0.12	0.10
14	体育館 渡り廊下雨どい②	0.39	0.28	0.26	0.17	0.10	0.08
15	体育館 渡り廊下雨どい③	0.17	0.14	0.13	0.16	0.09	0.08
16	渡り廊下①	0.39	0.18	0.16	0.11	0.11	0.10
17	体育館 手前雨どい①	0.73	0.32	0.24	0.11	0.11	0.11
18	体育館 手前雨どい②	0.56	0.18	0.35	0.12	0.11	0.12
19	体育館 手前雨どい③	0.52	0.23	0.23	0.14	0.13	0.12
20	体育館 手前雨どい④	0.94	0.31	0.23	0.13	0.12	0.11
21	体育館 手前雨どい⑤	0.60	0.24	0.20	0.12	0.11	0.11
22	体育館 手前雨どい⑥	0.71	0.38	0.32	0.14	0.11	0.09
23	体育館 手前雨水ます	0.26	0.21	0.19	0.11	0.10	0.09
24	体育館 入口雨どい下	0.37	0.32	0.30	0.14	0.09	0.09
25	渡り廊下②	0.26	0.15	0.15	0.16	0.13	0.11
26	渡り廊下③	0.40	0.20	0.18	0.17	0.11	0.10
27	渡り廊下④	0.37	0.16	0.14	0.14	0.12	0.09
28	管理棟 雨水ます①	0.74	0.40	0.32	0.13	0.12	0.11
29	管理棟 雨水ます②	0.92	0.38	0.30	0.16	0.13	0.12
30	管理棟 雨水ます③	1.00	0.39	0.33	0.16	0.13	0.13
31	管理棟 雨水ます④	0.72	0.35	0.31	0.19	0.17	0.15
32	管理棟 雨水ます⑤	0.72	0.26	0.23	0.15	0.13	0.11
33	管理棟 雨水ます⑥	0.64	0.38	0.27	0.10	0.09	0.09
34	駐車場 横水飲場	0.29	0.24	0.22	0.13	0.13	0.13
35	駐車場 側溝	0.75	0.51	0.36	0.10	0.11	0.11
36	駐車場 横雨水ます	1.04	0.54	0.41	0.15	0.13	0.12
37	庭園 樹木下(クスノキ)	0.20	0.20	0.19	0.09	0.08	0.08
38	庭園 植込み	0.83	0.70	0.55	0.10	0.09	0.10
39	屋外トイレ 屋根下①	0.97	0.42	0.57	0.09	0.09	0.09
40	屋外トイレ 屋根下②	0.78	0.35	0.27	0.09	0.10	0.10
41	グラウンド 入口水飲み場	0.38	0.23	0.25	0.14	0.15	0.12

	場所	除染前			除染後		
		5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
42	グラウンド入口側溝①	0.58	0.52	0.38	0.17	0.17	0.13
43	グラウンド入口側溝②	0.49	0.47	0.47	0.12	0.13	0.13
44	学園正面入口側溝	0.38	0.24	0.44	0.12	0.12	0.12
45	グラウンド砂場	0.38	0.44	0.42	0.12	0.12	0.12
46	グラウンド倉庫前側溝	1.10	0.61	0.42	0.19	0.14	0.12
47	グラウンド倉庫前屋根下	0.52	0.28	0.26	0.16	0.13	0.11
48	グラウンド倉庫道路側屋根下	1.15	0.53	0.46	0.14	0.14	0.15
49	グラウンド倉庫横雨水ます①	0.80	0.34	0.31	0.15	0.14	0.13
50	グラウンド倉庫横側溝	0.73	0.49	0.32	0.14	0.13	0.13
51	グラウンド倉庫横雨水ます②	0.55	0.30	0.28	0.16	0.15	0.14
52	グラウンド横植込	0.39	0.33	0.26	0.10	0.10	0.12
53	グラウンド横側溝②	0.43	0.29	0.28	0.19	0.17	0.14
54	クラブハウス雨どい①	0.53	0.41	0.38	0.13	0.13	0.12
55	クラブハウス雨どい②	0.64	0.50	0.40	0.09	0.10	0.10
56	クラブハウス雨どい③	0.80	0.61	0.45	0.10	0.10	0.10
57	クラブハウス排水溝	0.62	0.26	0.40	0.21	0.16	0.13
58	テニスコート側溝①	0.69	0.41	0.29	0.17	0.16	0.15
59	テニスコート側溝②	0.51	0.53	0.39	0.14	0.12	0.13
60	テニスコート側溝③	0.72	0.44	0.55	0.13	0.14	0.14
61	テニスコート側溝④	0.51	0.43	0.36	0.19	0.12	0.13
62	作業小屋裏	0.31	0.21	0.20	0.13	0.12	0.11
63	キャンプファイヤー場側溝①	0.31	0.28	0.26	0.14	0.13	0.10
64	キャンプファイヤー場側溝②	0.54	0.42	0.34	0.16	0.14	0.14
65	キャンプファイヤー場側溝③	0.45	0.36	0.34	0.18	0.15	0.13
66	キャンプファイヤー場側溝④	0.43	0.31	0.30	0.16	0.15	0.14
67	グラウンド樹木下①	0.17	0.23	0.32	0.13	0.11	0.10
68	グラウンド横雨水ます	0.24	0.22	0.22	0.11	0.11	0.11
69	グラウンド樹木下②	0.25	0.22	0.20	0.09	0.09	0.10
70	グラウンド横側溝①	0.73	0.38	0.31	0.12	0.11	0.10
71	自転車倉庫横水飲場	0.37	0.19	0.18	0.16	0.12	0.10
72	グラウンド横側溝②	0.62	0.45	0.32	0.12	0.12	0.11
73	自転車倉庫雨どい①	1.96	0.76	0.30	0.11	0.10	0.09
74	自転車倉庫雨どい②	0.60	0.58	0.52	0.10	0.10	0.11
75	自転車倉庫裏	1.15	0.61	0.44	0.09	0.09	0.11
76	自転車倉庫横雨水ます	0.22	0.21	0.19	0.09	0.10	0.12
77	ブランコ中央①	0.47	0.27	0.31	0.11	0.11	0.09
78	すべり台下	0.70	0.31	0.30	0.09	0.10	0.11
79	ブランコ中央②	0.32	0.21	0.21	0.08	0.07	0.07
80	遊具横水飲場雨水ます	0.35	0.31	0.27	0.15	0.14	0.13
81	竪穴式住居横雨水ます①	0.27	0.33	0.25	0.11	0.12	0.11
82	竪穴式住居屋根下①	0.50	0.37	0.29	0.16	0.15	0.14
83	竪穴式住居横雨水ます②	0.26	0.22	0.17	0.12	0.12	0.12
84	竪穴式住居中雨水ます	0.32	0.24	0.19	0.19	0.17	0.14
85	竪穴式住居屋根下②	0.56	0.29	0.21	0.09	0.12	0.12
86	藤棚雨水ます	0.48	0.33	0.33	0.14	0.14	0.14
87	ザリガニ池横側溝	0.61	0.31	0.28	0.09	0.12	0.13

# 局所的な放射能測定の配置図

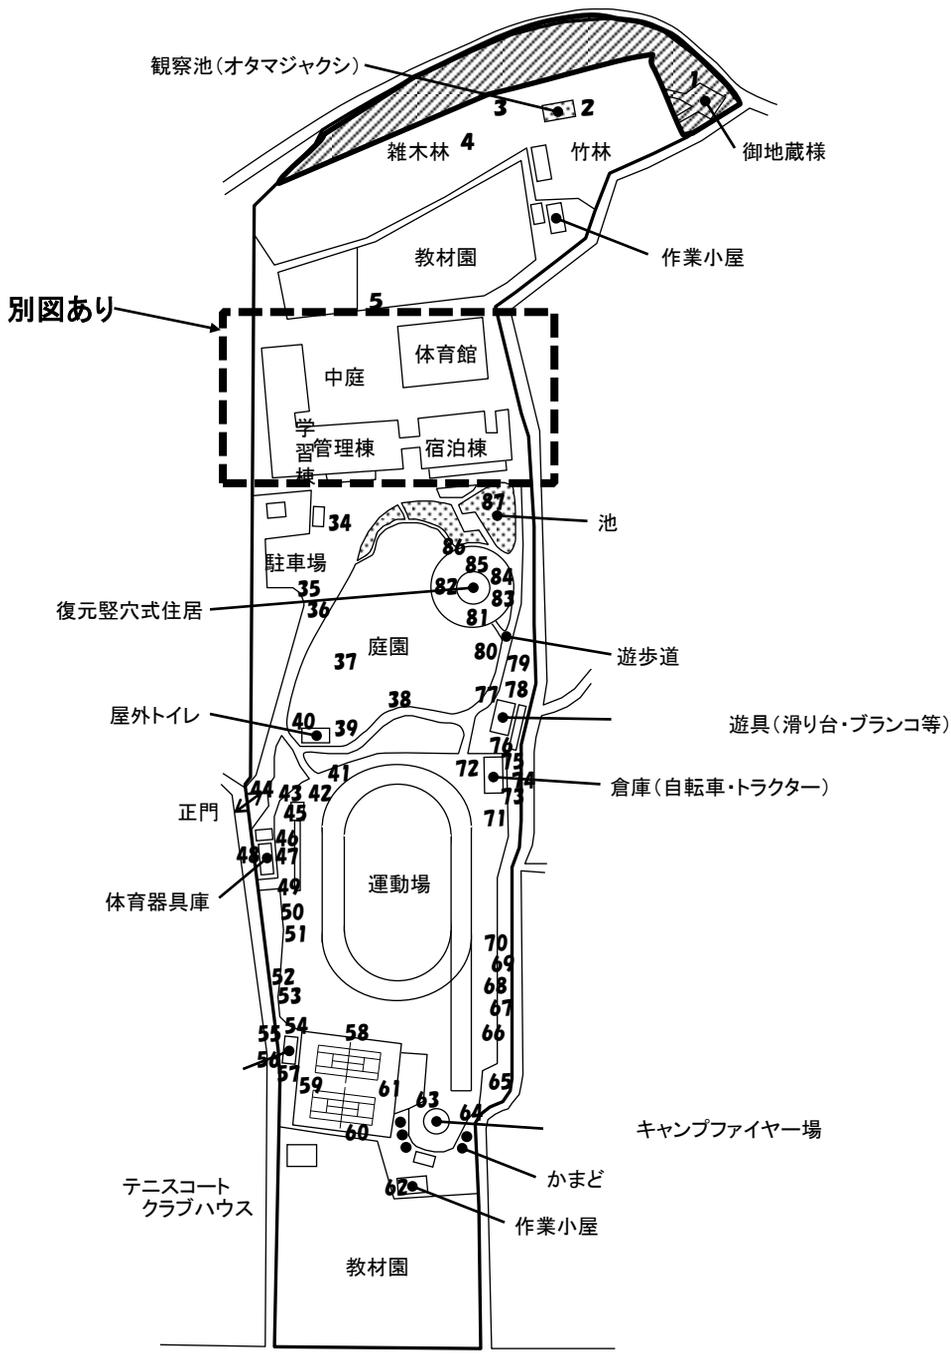

**別図**

